2022
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ABRIL-JUNIO 2022
FECHA DE CORTE: 30-junio-2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Occidente
Entidad federativa: Sinaloa
Clave Inst 911: 25MSU0370Q

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: Dra. Gloria Arechiga Sánchez
Cargo: Directora de Planeación y Evaluación
Teléfono: (667) 759-13-00 ext. 2226
Correo electrónico: gloria.arechiga@uadeo.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Arq. Joel Sebastián García Regalado
Cargo: Director de Construcción y Mantenimiento
Teléfono: (667) 759-13-00 ext- 2397 y 2398
Correo electrónico: joel.garcia@uadeo.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO / OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto: Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto [1]: Espacio/equipo	Cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance [2]	Acciones por realizar	% de avance	Fechas [3]: Inicio	Término	Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada: ¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
															GLOBAL DEL PROYECTO									
1	**Construcción de 4t. Etapa de Edificio "J", incluye 5 aulas, Unidad Regional Guasave.**	X					$ 6,500,000.00	$0.00	$ 6,500,000.00	Aulas	5	260.00			0	01-Jul-2022	27-Dic-2022	Se cumplió con la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y CompraNet-Sinaloa, se llevó a cabo la visita al sitio de la obra y se celebró la primera y última Junta de Aclaraciones; se realizó la Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, Fallo y firma de contrato. La obra iniciará el día 01 de Julio de 2022.						
										Área común	1	71.00												
										TOTAL	**6**	**331.00**												
2	**Construcción de 3ra. Etapa de Edificio "G", incluye 5 aulas, módulo de baños y módulo de escaleras, Unidad Regional Guamúchil.**	X					$ 7,980,000.00	$0.00	$ 7,980,000.00	Aulas	5	260.00			0	01-Jul-2022	27-Dic-2022	Se cumplió con la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y CompraNet-Sinaloa, se llevó a cabo la visita al sitio de la obra y se celebró la primera y última Junta de Aclaraciones; se realizó la Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, Fallo y firma de contrato. La obra iniciará el día 01 de Julio de 2022.						
										Sanitarios	1	52.00												
										Área común	2	112.00												
										TOTAL	**8**	**424.00**												
3	**Construcción de 4ta. Etapa de Edificio "F", incluye 5 aulas, Unidad Regional Mazatlán.**	X					$ 4,900,000.00	$0.00	$ 4,900,000.00	Aulas	5	260.00			0	01-Jul-2022	27-Nov-2022	Se cumplió con la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y CompraNet-Sinaloa, se llevó a cabo la visita al sitio de la obra y se celebró la primera y última Junta de Aclaraciones; se realizó la Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, Fallo y firma de contrato. La obra iniciará el día 01 de Julio de 2022.						
										Área común	1	77.00												
										TOTAL	**6**	**337.00**												
4	**Construcción de 4ta. Etapa de la Unidad de Investigación en Salud y Ciencias del Deporte, Unidad Regional Culiacán Campus CESS.**	X					$ 6,175,886.00	$0.00	$ 6,175,886.00	Aulas	4	214.00			0	01-Jul-2022	27-Nov-2022	Se cumplió con la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y CompraNet-Sinaloa, se llevó a cabo la visita al sitio de la obra y se celebró la primera y última Junta de Aclaraciones; se realizó la Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, Fallo y firma de contrato. La obra iniciará el día 01 de Julio de 2022.						
										Taller	1	136.00												
										Laboratorio	1	136.00												
										Ofic.Admvas.	4	100.00												
										Sanitarios	1	34.00												
										Área Común	3	206.00												
										Áreas verdes y exp	1	217.00												
										TOTAL:	**15**	**1043.00**												
							$25,555,886.00	**$0.00**	**$25,555,886.00**															

DRA. SYLVIA RUIZ DIAZ CAMARGO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos dd, mm y aa.

2022	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado ABRIL-JUNIO 2022
AÑO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		FECHA DE CORTE: 30-Junio-2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: **Construcción de 4ta. Etapa de Edificio "J", incluye 5 aulas, Unidad Regional Guasave.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av.Universidad S/N, Fracc. Villa Universidad, C.P. 81048, Guasave, Sinaloa.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: Fachada posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

F3: Fachada lateral izquierda

F4: Fachada lateral derecha

Sylvia Díaz Díaz C.

DRA. SYLVIA FAZIDIAZ CABACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.**

2022
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ABRIL-JUNIO 2022
FECHA DE CORTE 30-Junio-2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: **Construcción de 3ra. Etapa de Edificio "G" incluye 5 aulas, módulo de baños y módulo de escaleras. Unidad Regional Guamúchil.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Blvd. Lázaro Cárdenas y José María Vigil s/n Col. Magisterio, C.P.81470, Guamúchil, Sinaloa.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: Fachada posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

F3: Fachada lateral izquierda

F4: Fachada lateral derecha

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.**

2022
AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ABRIL-JUNIO 2022
FECHA DE CORTE: 30-Junio-22

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Construcción de 4ta. Etapa de Edificio "F", incluye 5 aulas, Unidad Regional Mazatlán**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA Ó PROYECTO

Av. Del Mar No. 1200, Fracc. Tellerías, C.P. 82100, Mazatlán, Sinaloa.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: Fachada posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

F3: Lateral izquierda

F4: Foto exterior de area de azotea

F5: Exterior e interior de Obra

DRA. SYLVIA RAÚL DÍAZ CAMACHO
RECTOR

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.**

2022
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: ABRIL-JUNIO 2022
FECHA DE CORTE: 30-JUNIO-2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance: 0

PRIORIDAD: 4

Nombre de la obra: **Construcción de 4ta. Etapa de la Unidad de Investigación en Salud y Ciencias del Deporte, Unidad Regional Culiacán, Campus CESS**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

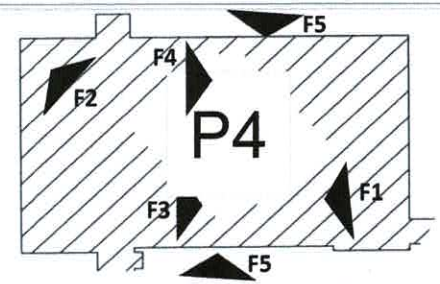

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Culiacán-Imala Km. 2
Culiacán, Sinaloa.

FOTOS

F1: Laboratorios

F2: Aulas

Comentarios de los trabajos realizados:

F3: Oficinas Administrativas

F4: Baños

F5: Obra Exterior

Sylvia Paz Díaz C.
SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.
