2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero-Marzo 2021
FECHA DE CORTE: 31-Mzo-2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

UAdeO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

Nombre: **Universidad Autónoma de Occidente**
Entidad federativa: Sinaloa
Clave Inst 911: 25MSU0370Q

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Dra. Gloria Aréchiga Sánchez	Nombre: Arq. Joel Sebastián García Regalado
Cargo: Directora de Planeación y Evaluación	Cargo: Director de Construcción y Mantenimiento
Teléfono: (667) 759-13-00 ext. 2226	Teléfono: (667) 759-13-00 ext- 2397 y 2398
Correo electrónico: gloria.arechiga@uadeo.mx	Correo electrónico: joel.garcia@uadeo.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO / OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto: Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto [1]: Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance [2]	Acciones por realizar	% de avance	Fechas[3]: Inicio	Término	Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada: ¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	**Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional**		x				$ 10,000,000.00	$0.00	10,000,000.00						GLOBAL DEL PROYECTO									
										Aulas	53				0	24-myo-21	31-dic-21	El expediente técnico del proyecto se entregó en el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa(ISIFE) para revisión y validación. El convenio de coordinación con ISIFE se encuentra en proceso de firmas.						
										Laboratorios	7													
										TOTAL	**60**	**0.00**												
2	**Construcción de 3ra. Etapa de Edificio "F", incluye 6 aulas y un laboratorio, Unidad Regional Mazatlán.**	x					$ 7,000,000.00	$0.00	$ 7,000,000.00						GLOBAL DEL PROYECTO									
										Aulas	6	312.00			0	24-myo-21	31-dic-21	El expediente técnico del proyecto se entregó en el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa(ISIFE) para revisión y validación. El convenio de coordinación con ISIFE se encuentra en proceso de firmas.						
										Laboratorio	1	104.00												
										Área común	1	120.00												
										TOTAL	**8**	**536.00**												
3	**Construcción de 3ra. Etapa de la Unidad de Investigación en Salud y Ciencias del Deporte, Unidad Regional Culiacán.**	x					$ 3,446,658.28	$0.00	$ 3,446,658.28						GLOBAL DEL PROYECTO									
										Laboratorios	4	471.00			0	24-myo-21	31-dic-21	El expediente técnico del proyecto se entregó en el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa(ISIFE) para revisión y validación. El convenio de coordinación con ISIFE se encuentra en proceso de firmas.						
										Oficina Admva.	1	95.00												
										Sanitarios	2	34.00												
										Área común	1	226.00												
										Área verde	1	217.00												
										TOTAL	**9**	**1043.00**												
							$20,446,658.28	**$0.00**	**$20,446,658.28**															

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA
Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: **dd, mm y aa.**

2021	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado **Enero-Marzo 2021**
AÑO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		FECHA DE CORTE: 31-Mzo-2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Por tratarse de todas las Unidades Regionales no se coloca el croquis de localización y la señalización de las fotos por falta de espacio.

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

U.R. El Fuerte: Carretera El Fuerte-Choix, Km. 1.5. C.P. 81820, El Fuerte, Sinaloa.
U.R. Los Mochis: Blvd. Macario Gaxiola y Carretera Internacional, Col. Las Malvinas, C.P. 81223, Los Mochis, Sinaloa.
U.R. Guasave: Av.Universidad S/N, Fracc. Villa Universidad, C.P. 81048, Guasave, Sinaloa.
U.R. Guamúchil: Blvd. Lázaro Cárdenas y José María Vigil s/n Col. Magisterio, C.P.81470, Guamúchil, Sinaloa.
U.R. Culiacán: Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona s/n, Col. 4 de Marzo, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.
U.R. Mazatlán: Av. Del Mar No. 1200, Fracc. Tellerías, C.P. 82100, Mazatlán, Sinaloa.
Ext. Sinaloa de Leyva: Colonia San Felipe y Santiago S/N,Interior del Polideportivo, C.P. 81900 Sinaloa de Leyva, Sinaloa.
Ext. El Rosario: Morelos No. 75, Col. Centro, El Rosario, Sinaloa.
Ext. Escuinapa: Carretera a Teacapán, Km.1, Centro Educativo Antonio Toledo Corro, Escuinapa, Sinaloa

FOTOS

F1: Aula tipo

F2: Aula tipo

Comentarios de los trabajos realizados:

NOTA: Se van a equipar 57 aulas tipo con mesas binarias y sillas para alumnos en las Unidades Regionales y Extensiones académicas.

F3: Aula tipo

F4: Aula tipo

F5: Aula tipo

DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA PEGAZO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero-Marzo 2021
FECHA DE CORTE: 31-Mzo-2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional. (Laboratorio Gastronomía y Nutrición U.R. Los Mochis)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

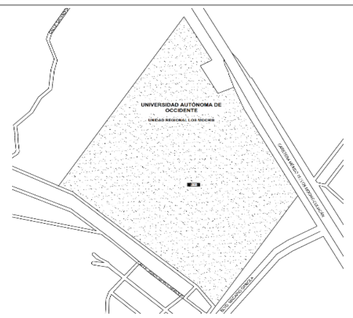



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Blvd. Macario Gaxiola y Carretera Internacional, Col. Las Malvinas, C.P. 81223, Los Mochis, Sinaloa.

FOTOS

F1: Foto interior vista posterior.

F2: Foto interior vista lateral izquierdo.

Comentarios de los trabajos realizados:

DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero-Marzo 2021
FECHA DE CORTE: 31-Mzo-2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional. (Laboratorio Gastronomía y Nutrición U.R. Guasave)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

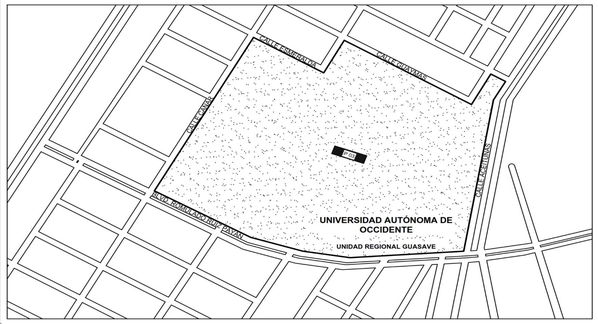



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av.Universidad S/N, Fracc. Villa Universidad, C.P. 81048, Guasave, Sinaloa.

FOTOS

F1: Foto interior vista frontal

F2: Foto interior, vista lateral derecho

Comentarios de los trabajos realizados:

Este espacio se adecuará y equipará para el Laboratorio Gastronomía y Nutrición.

F3: Foto interior vista posterior

F4: Foto interior vista lateral izquierdo

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero-Marzo 2021
FECHA DE CORTE: 31-Mzo-2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional. (Laboratorio de Gastronomía U.R. Guamúchil)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

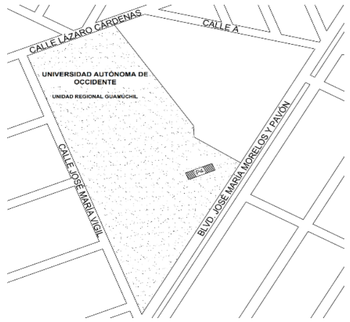



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Blvd. Lázaro Cárdenas y José María Vigil s/n Col. Magisterio, C.P.81470, Guamúchil, Sinaloa.

FOTOS

F1: Fonto interior vista posterior

F2: Foto interior vista lateral izquierda

Comentarios de los trabajos realizados:

Este espacio se adecuará y se equipará para el Laboratorio de Gastronomía.

F3: Foto interior vista frontal

DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero-Marzo 2021
FECHA DE CORTE: 31-Mzo-2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional. (Laboratorio Gastronomía y Nutrición U.R. Mazatlán)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Del Mar No. 1200, Fracc. Tellerías, C.P. 82100, Mazatlán, Sinaloa.

FOTOS

F1: Foto interior lateral derecho (aula tipo)

F2: Foto interior lagteral derecho (aula tipo)

Comentarios de los trabajos realizados:

El Laboratorio de Gastronomía y Nutrición se encuentra en proceso de construcción en segunda etapa, se incluyen fotos para ejemplificar los espacios a equipar.Esta obra está por entregarse en el mes de mayo a traves del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de obra

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero-Marzo 2021
FECHA DE CORTE: 31-Mzo-2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional. (Laboratorio de Investigación en Biotecnología Biomédica, U.R. Culiacán)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

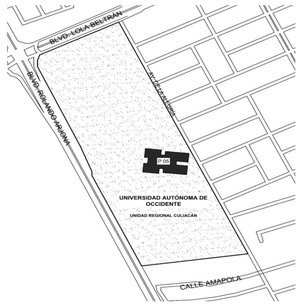

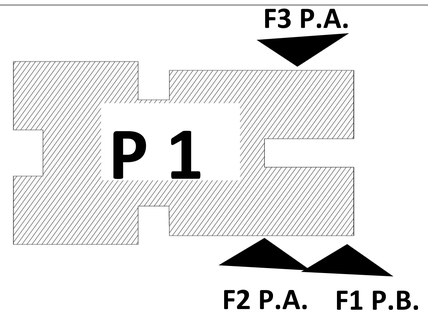

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona s/n, Col. 4 de Marzo, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

FOTOS

F1:Fotovista interior de Laboratorio 1 planta baja

F2: Foto de vista interior Laboratorio 3 Planta Alta

Comentarios de los trabajos realizados:

F3: Foto vista interior Laboratorio 4 Planta Alta

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero-Marzo 2021
FECHA DE CORTE: 31-Mzo-2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional. (Laboratorio Criminalística y Ciencias Periciales. U.R. Los Mochis)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

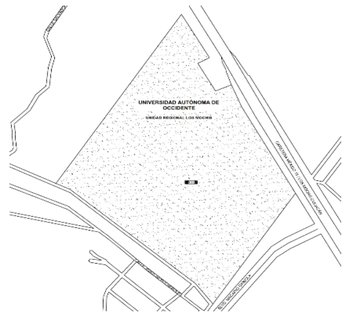

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Blvd. Macario Gaxiola y Carretera Internacional, Col. Las Malvinas, C.P. 81223, Los Mochis, Sinaloa.

FOTOS

F1: Foto interior vista lateral izquierda

F2: Foto interior vista frontal

Comentarios de los trabajos realizados:

Este espacio se adecuará y equipará para el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Periciales de la U.R. Los Mochis.

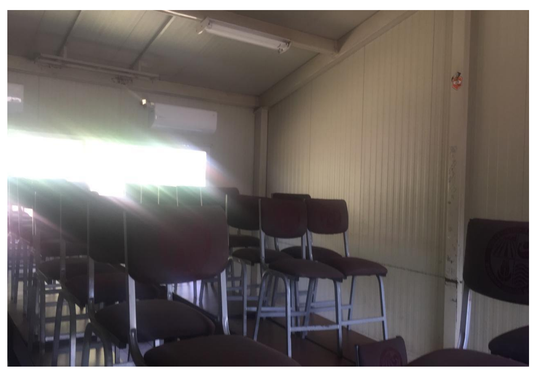

F3: Foto interior vista posterior

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2021	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado Enero-Marzo 2021
AÑO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		FECHA DE CORTE: 31-Mzo-2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional. (Laboratorio Criminalística y Ciencias Periciales. U.R. Mazatlán)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Del Mar No. 1200, Fracc. Tellerías, C.P. 82100, Mazatlán, Sinaloa.

FOTOS

F1:Foto interior lateral derecho (aula tipo)

F2: Foto interior lateral derecho (aula tipo)

Comentarios de los trabajos realizados:

La prioridad 2 de FAM 2021 consiste en la construcción de la 3ra. Etapa del Edifico "F", en el que se incluye El Laboratorio de Criminalística y Ciencias Periciales , actualmente se construye la segunda etapa, sin embargo se incluyen fotos para ejemplificar los espacios a equipar.

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. ANGEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2021	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado **Enero-Marzo 2021**
AÑO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		FECHA DE CORTE: 31-Mzo-2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Construcción de 3ra. Etapa de Edificio "F", incluye 6 aulas y un laboratorio, Unidad Regional Mazatlán**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Del Mar No. 1200, Fracc. Tellerías, C.P. 82100, Mazatlán, Sinaloa.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: lateral derecha

Comentarios de los trabajos realizados:

Actualmente se construye la segunda etapa del Edificio.

F3: Lateral izquierda

F4: Entrada

MAL. SYLVIA RAZ DIAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero-Marzo 2021
FECHA DE CORTE: 31-Mzo-2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Construcción de 3ra. Etapa de la Unidad de Investigación en Salud y Ciencias del Deporte, Culiacán.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

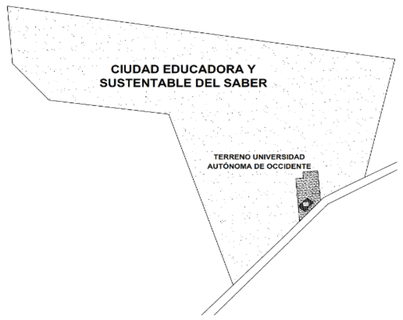

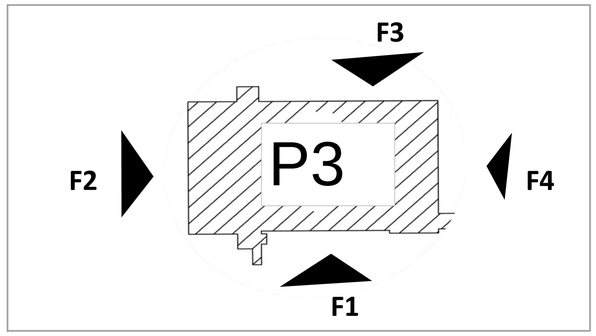

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Culiacán-Imala Km. 2
Culiacán, Sinaloa.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: lateral izaquierda

Comentarios de los trabajos realizados:

F3: Fachada posterior

F4: Fachada lateral derecha

DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.
