2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio-Septiembre 2021
FECHA DE CORTE: 30-Septiembre-2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Occidente
Entidad federativa: Sinaloa
Clave Inst 911: 25MSU0370Q

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Dra. Gloria Aréchiga Sánchez	Nombre: Arq. Joel Sebastián García Regalado
Cargo: Directora de Planeación y Evaluación	Cargo: Director de Construcción y Mantenimiento
Teléfono: (667) 759-13-00 ext. 2226	Teléfono: (667) 759-13-00 ext- 2397 y 2398
Correo electrónico: gloria.sánchez@uadeo.mx	Correo electrónico: joel.garcia@uadeo.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO / OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto: Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto [1]: Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance [2]	Acciones por realizar	% de avance	Fechas [3]: Inicio	Término	Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada: ¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	**Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional**		x				$ 10,000,000.00	$4,755,211.78	5,244,788.22	Aulas	53		Se adquirió el mobiliario al 100 % (mesas binarias y sillas) para aulas	Se adquirió la partida correspondiente a mesas binarias y sillas al 100% y se encuentra pendiente de adquirir Equipo didáctico y multimedia, transformador eléctrico, equipo especial para laboratorio y mobiliario de acero inoxidable.	GLOBAL DEL PROYECTO 47	20-Sep-21	31-dic-21	Se pagó la totalidad de mobiliario adquirido de mesas binarias y sillas y se encuentra pendiente de adquirir Equipo didáctico y multimedia, transformador eléctrico, equipo especial para laboratorio y mobiliario de acero inoxidable.						
										Laboratorios	7													
										TOTAL	**60**	**0.00**												
2	**Construcción de 3ra. Etapa de Edificio "F", incluye 6 aulas y un laboratorio, Unidad Regional Mazatlán.**	x					$ 7,000,000.00	$2,205,000.18	$ 4,794,999.82	Aulas	6	312.00	Trabajos de mejoramiento del terreno con estabilización del área del edificio, colocación de material de banco compactado, colocación de acero de refuerzo, habilitado y colocación de cimbras de madera en zapatas y trabes de cimentación, habilitación de colado de muros cabeceros y columnas del primer nivel. Se concluye en este mes el primer nivel con su estructura (columnas, muros, trabes y losas de concreto) y se encuentran en proceso de terminación de estructura segundo nivel (columnas, muros, trabes y losas de concreto).	Elementos de acción inmediata es en azotea terminar cimbra en trabes y losas, habilitar acero, programar visita verificacion estructura para aprobación y colado de la misma.	GLOBAL DEL PROYECTO 47	01-Jul-21	31-dic-21								
										Laboratorio	1	104.00												
										Área común	1	120.00												
										TOTAL	**8**	**536.00**												
3	**Construcción de 3ra. Etapa de la Unidad de Investigación en Salud y Ciencias del Deporte, Unidad Regional Culiacán.**	x					$ 3,446,658.28	$1,085,697.36	$ 2,360,960.92	Laboratorios	4	471.00	Construcción de muros interiores y aplanado de los mismos, construcción de pretil, entortado de azotea, impermeabilización de azotea terminada, se tiene en proceso aplanados. Se realiza limpieza para comenzar el colado de firme.	Colado de firme de concreto y canalización de instalaciones eléctricas y colocación de vitropiso.	GLOBAL DEL PROYECTO 35	01-Jul-21	31-dic-21								
										Oficina Admva.	1	95.00												
										Sanitarios	2	34.00												
										Área común	1	226.00												
										Área verde	1	217.00												
										TOTAL	**9**	**1043.00**												
							$20,446,658.28	**$8,045,909.32**	**$12,400,748.96**															

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA
Nombre y firma del Titular de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: **dd, mm y aa.**

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio-Septiembre 2021
FECHA DE CORTE: 30-Septiembre-2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

100

Sólo para este apartado de mobiliario

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional.**

CROQUIS DE LOCALIZACION

Por tratarse de todas las Unidades Regionales no se coloca el croquis de localización y la señalización de las fotos por falta de espacio.

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

U.R. El Fuerte: Carretera El Fuerte-Choix, Km. 1.5. C.P. 81820, El Fuerte, Sinaloa.
U.R. Los Mochis: Blvd. Macario Gaxiola y Carretera Internacional, Col. Las Malvinas, C.P. 81223, Los Mochis, Sinaloa.
U.R. Guasave: Av.Universidad S/N, Fracc. Villa Universidad, C.P. 81048, Guasave, Sinaloa.
U.R. Guamúchil: Blvd. Lázaro Cárdenas y José María Vigil s/n Col. Magisterio, C.P.81470, Guamúchil, Sinaloa.
U.R. Culiacán: Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona s/n, Col. 4 de Marzo, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.
U.R. Mazatlán: Av. Del Mar No. 1200, Fracc. Tellerías, C.P. 82100, Mazatlán, Sinaloa.
Ext. Sinaloa de Leyva: Colonia San Felipe y Santiago S/N,Interior del Polideportivo, C.P. 81900 Sinaloa de Leyva, Sinaloa.
Ext. El Rosario: Morelos No. 75, Col. Centro, El Rosario, Sinaloa.
Ext. Escuinapa: Carretera a Teacapán, Km.1, Centro Educativo Antonio Toledo Corro, Escuinapa, Sinaloa.

FOTOS

F1: Aula con nuevo mobiliario

F2: Aula con nuevo mobiliario

Comentarios de los trabajos realizados:

NOTA: Se equiparon 53 aulas tipo con mesas binarias y sillas para alumnos en las Unidades Regionales y Extensiones académicas.

F3: Aula con nuevo mobiliario

F4:Aula con nuevo mobiliario

F5: Aula con nuevo mobiliario

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA
Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2021	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado Julio-Septiembre 2021
AÑO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		FECHA DE CORTE: 30 Septiembre 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional. (Laboratorio Gastronomía y Nutrición U.R. Los Mochis)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Blvd. Macario Gaxiola y Carretera Internacional, Col. Las Malvinas, C.P. 81223, Los Mochis, Sinaloa.

FOTOS

F1: Foto interior vista lateral derecha.

F2: Foto interior vista frontal .

Comentarios de los trabajos realizados:

Mobiliario pendiente por adquirir: Equipo didáctico y multimedia, equipo especial para laboratorio y mobiliario de acero inoxidable.

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL CEBALLOS ANGULO ALCAZADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio-Septiembre 2021
FECHA DE CORTE: 30 Septiembre 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional. (Laboratorio Gastronomía y Nutrición U.R. Guasave)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

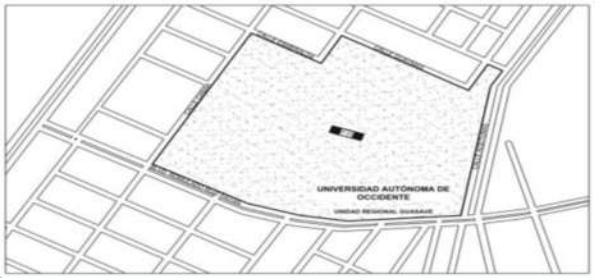

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av.Universidad S/N, Fracc. Villa Universidad, C.P. 81048, Guasave, Sinaloa.

FOTOS

F1: Foto interior vista frontal

F2: Foto interior, vista lateral derecha

Comentarios de los trabajos realizados:

Mobiliario pendiente por adquirir: Equipo didáctico y multimedia, equipo especial para laboratorio y mobiliario de acero inoxidable.

F3: Foto interior vista lateral izquierda

F4: Foto interior vista posterior

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SERRANO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio-Septiembre 2021
FECHA DE CORTE: 30 Septiembre 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional. (Laboratorio de Gastronomía U.R. Guamúchil)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Blvd. Lázaro Cárdenas y José María Vigil s/n Col. Magisterio, C.P.81470, Guamúchil, Sinaloa.

FOTOS

F1: Foto interior vista frontal

F2: Foto interior vista lateral derecha

Comentarios de los trabajos realizados:

Mobiliario pendiente por adquirir: Equipo didáctico y multimedia, equipo especial para laboratorio y mobiliario de acero inoxidable.

F3: Foto interior vista posterior

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SERRATOS [illegible]
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.**

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio-Septiembre 2021
FECHA DE CORTE: 30-Septiembre-2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional. (Laboratorio Gastronomía y Nutrición U.R. Mazatlán)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Del Mar No. 1200, Fracc. Tellerías, C.P. 82100, Mazatlán, Sinaloa.

FOTOS

F1: Foto interior lateral derecho (aula tipo)

F2: Foto interior lagteral derecho (aula tipo)

Comentarios de los trabajos realizados:

Mobiliario pendiente por adquirir: Equipo didáctico y multimedia, equipo especial para laboratorio y mobiliario de acero inoxidable.

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de obra

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA RECALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio-Septiembre 2021
FECHA DE CORTE: 30 Septiembre 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional. (Lab. Unidad de Invest. en Biotecnología Biomédica, U.R. Culiacán)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

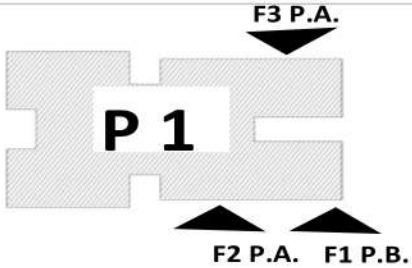

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona s/n, Col. 4 de Marzo, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

FOTOS

F1: Foto de vista interior de Laboratorio 1 planta baja

F2: Foto de vista interior Laboratorio 3 Planta Alta

Comentarios de los trabajos realizados:

Mobiliario pendiente por adquirir: Equipo didáctico y multimedia, transformador eléctrico, equipo especial para laboratorio y mobiliario de acero inoxidable.

F3: Fotode vista interior Laboratorio 4 Planta Alta

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SERAPIO VALENZUELA ALCALDE
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio-Septiembre 2021
FECHA DE CORTE: 30 Septiembre 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional. (Laboratorio Criminalística y Ciencias Periciales. U.R. Los Mochis)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Blvd. Macario Gaxiola y Carretera Internacional, Col. Las Malvinas, C.P. 81223, Los Mochis, Sinaloa.

FOTOS

F1: Foto interior vista frontal

F2: Foto interior vista lateral izquierda

Comentarios de los trabajos realizados:

Mobiliario pendiente por adquirir: Equipo didáctico y multimedia, equipo especial para laboratorio y mobiliario de acero inoxidable.

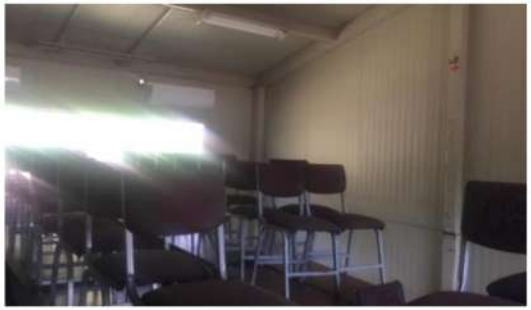

F3: Foto interior vista posterior

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SERRANO [illegible] ALCALDE
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio-Septiembre 2021
FECHA DE CORTE: 30 Septiembre 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Modernización del equipamiento de aulas y laboratorios a nivel institucional. (Laboratorio Criminalística y Ciencias Periciales. U.R. Mazatlán)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Del Mar No. 1200, Fracc. Tellerías, C.P. 82100, Mazatlán, Sinaloa.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: Foto interior aula tipo

Comentarios de los trabajos realizados:

La prioridad 2 de FAM 2021 se encuentra en proceso de ejecución de obra y consiste en la construcción de la 3ra. Etapa del Edificio "F", en el que se incluye El Laboratorio de Criminalística y Ciencias Periciales ,sin embargo se incluyen fotos de aula tipo para ejemplificar los espacios a equipar. Mobiliario pendiente por adquirir: Equipo didáctico y multimedia, equipo especial para laboratorio y mobiliario de acero inoxidable.

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA
Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio-Septiembre 2021
FECHA DE CORTE: 30 Septiembre 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

47

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Construcción de 3ra. Etapa de Edificio "F", incluye 6 aulas y un laboratorio, Unidad Regional Mazatlán**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Del Mar No. 1200, Fracc. Tellerías, C.P. 82100, Mazatlán, Sinaloa.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: Lateral derecha

Comentarios de los trabajos realizados:

En relación a la Estimación 01 se encuentra en trámite de pago en el área de Finanzas

F3: Fachada posterior

F4: Lateral Izquierda

F5: Interior de Obra

DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA
Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SERÁPIO [illegible] ALCARAZO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio-Septiembre 2021
FECHA DE CORTE: 30 Septiembre 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UAdeO

Porcentaje de avance

35

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Construcción de 3ra. Etapa de la Unidad de Investigación en Salud y Ciencias del Deporte, Culiacán, Sinaloa.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

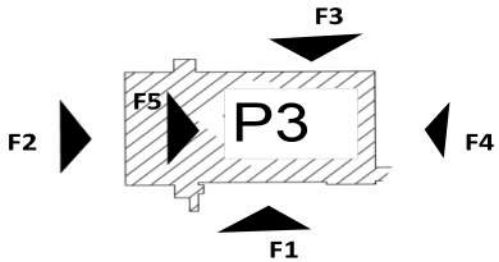

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Culiacán-Imala Km. 2
Culiacán, Sinaloa.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: Lateral Izquierda

Comentarios de los trabajos realizados:

F3: Fachada posterior

F4: Lateral derecha

F5: Interior de obra y Exterior del Edificio

DRA. SYLVIA RAZ DÍAZ CAMACHO
RECTORA
Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. JOEL SERRANO [illegible] ALCARAZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
